




ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

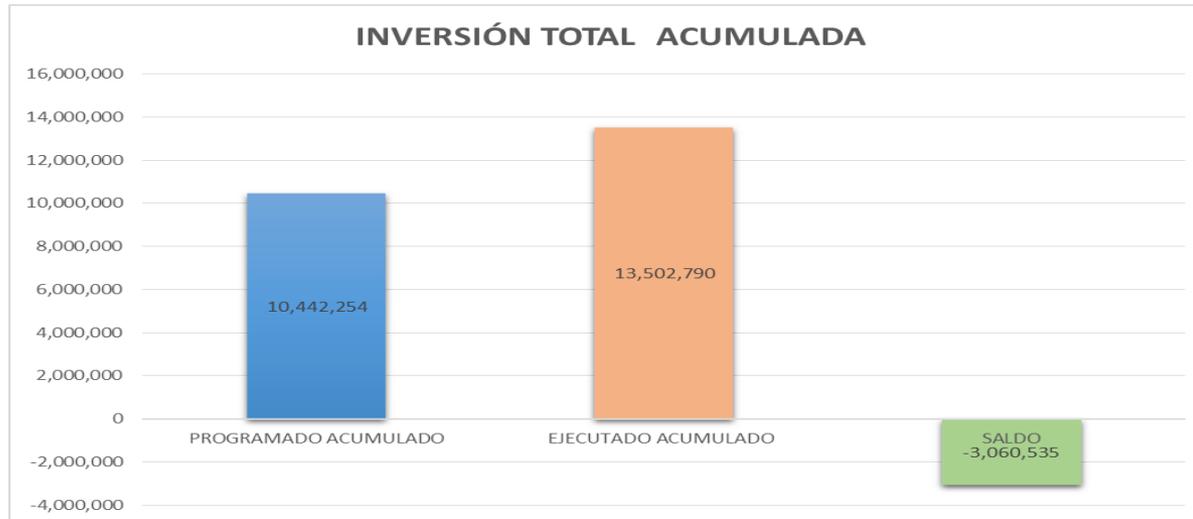

Resumen por Proyecto

NOMBRE DEL PROYECTO	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	ETAPA DEL PROYECTO (Preinversión, En ejecución u otro)	EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA 2018	%AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO A LA FECHA	%AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO A LA FECHA	FECHA INICIO DEL PROYECTO	FECHA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO	ESTADO ACTUAL
CONSTRUION Y MEJORAS DE VIVIENDAS TRINIDAD	5.808.284	EJECUCION	1.030.905.54	77.67%	71.67%	3 DE Agosto 2017	28 de Julio 2018	71.76%

*En momento pagado



PROGRAMACIÓN Vs EJECUCIÓN

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PROGR.	7.042.254.42	9.042.254.42	10.655.712.42	10.442.254.42	10.142.254.42	9.142.254.42	11.942.254.42	11.042.254.42	11.042.254.42	8.042.254.42	11.063.383.42	11.926.841.42	120.526.227.04
EJEC.	10.796.583.48	10.063.508.80	6.953.848.91	13.502.789.54									41.316.730.73
% CUMPL.	153.31%	111.29%	65.26%	129.31%									
